

Présentation du programme ANO et de la démarche de capitalisation

Le programme ANO (Assainissement Nord Ouest) a été mis en œuvre par un consortium de trois associations :

- Action contre la Faim (ACF), ONG française,
- Ansanm pou yon DEmen Miyo an Ayiti (ADEMA), association haïtienne.
- Initiative Développement (ID), ONG française, chef de file du consortium,

❖ Objectifs initiaux

- Objectifs principaux :
 - Préserver les ressources naturelles dans le département du Nord Ouest
 - Réduire la mortalité et la morbidité liées à un assainissement insuffisant dans le département du Nord Ouest
 - Améliorer les conditions socio-économiques des populations du Nord Ouest et renforcer leur dignité
- Objectif spécifique :
 - Renforcer les capacités des acteurs et élus de quatre communes du département du Nord Ouest à gérer l'eau potable et les excréta humains afin de prévenir les maladies liées à l'eau et l'assainissement.


❖ Données géographiques

La zone d'intervention du projet comprenait quatre communes du Nord Ouest.

- Bas Nord Ouest :
 - Bombardopolis : zones de Jacobaille, Roulette et Zétrenne,
 - Jean Rabel : zones d'Atrelle, Nan 18, Nan Coton, Nan Jeanty, Nan Sable et Porrier.
- Haut Nord Ouest :
 - Anse à Foleur : zones de Côte de Fer et Pointe des Icaques,
 - Saint Louis du Nord : zones de Bonneau et Rivière Salée.

Cette zone étant très étendue, les activités ont été réparties géographiquement entre les trois organisations du consortium :

- Action contre la Faim : Haut Nord Ouest,
- ADEMA : commune de Bombardopolis (Bas Nord Ouest),
- Initiative Développement : commune de Jean Rabel (Bas Nord Ouest),

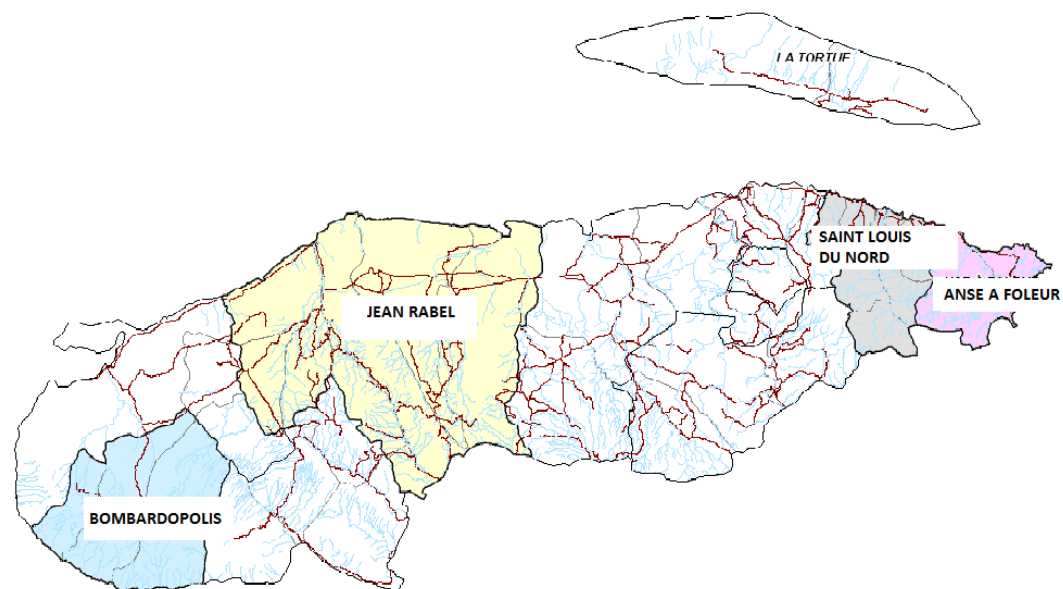

❖ Sélection des zones d'intervention

L'échelle d'action du projet s'est située au niveau familial : construction d'une latrine et d'un dispositif de lavage des mains par foyer. Des latrines scolaires ont été construites dans les écoles fréquentées par les enfants habitant les zones d'intervention du programme.

Les principaux critères d'éligibilité qui ont présidé au choix des zones d'intervention sont les suivants :

- Taux de latrinisation,
- Densité de l'habitat,
- Critères socio-économiques : niveau de vie de la population, cohésion sociale (dynamisme d'associations de jeunes, d'agriculteurs ou autres).

❖ Données temporelles


Le projet a duré 31 mois, de septembre 2008 à mars 2011.

Le déroulement global des activités est illustré par le chronogramme suivant :

	Année 1	Année 2	Année 3
<i>Présentation du projet</i>			
		<i>Sensibilisation : désagréments de la défécation à l'air libre et nécessité de posséder une latrine</i>	
		<i>Constructions de latrines</i>	
		<i>Sensibilisation : entretien des latrines</i>	
		<i>Sensibilisation : lavage des mains</i>	
			<i>Mise en place des dispositifs de lavage des mains</i>

❖ Ressources humaines

*Organigramme
opérationnel
du programme ANO*

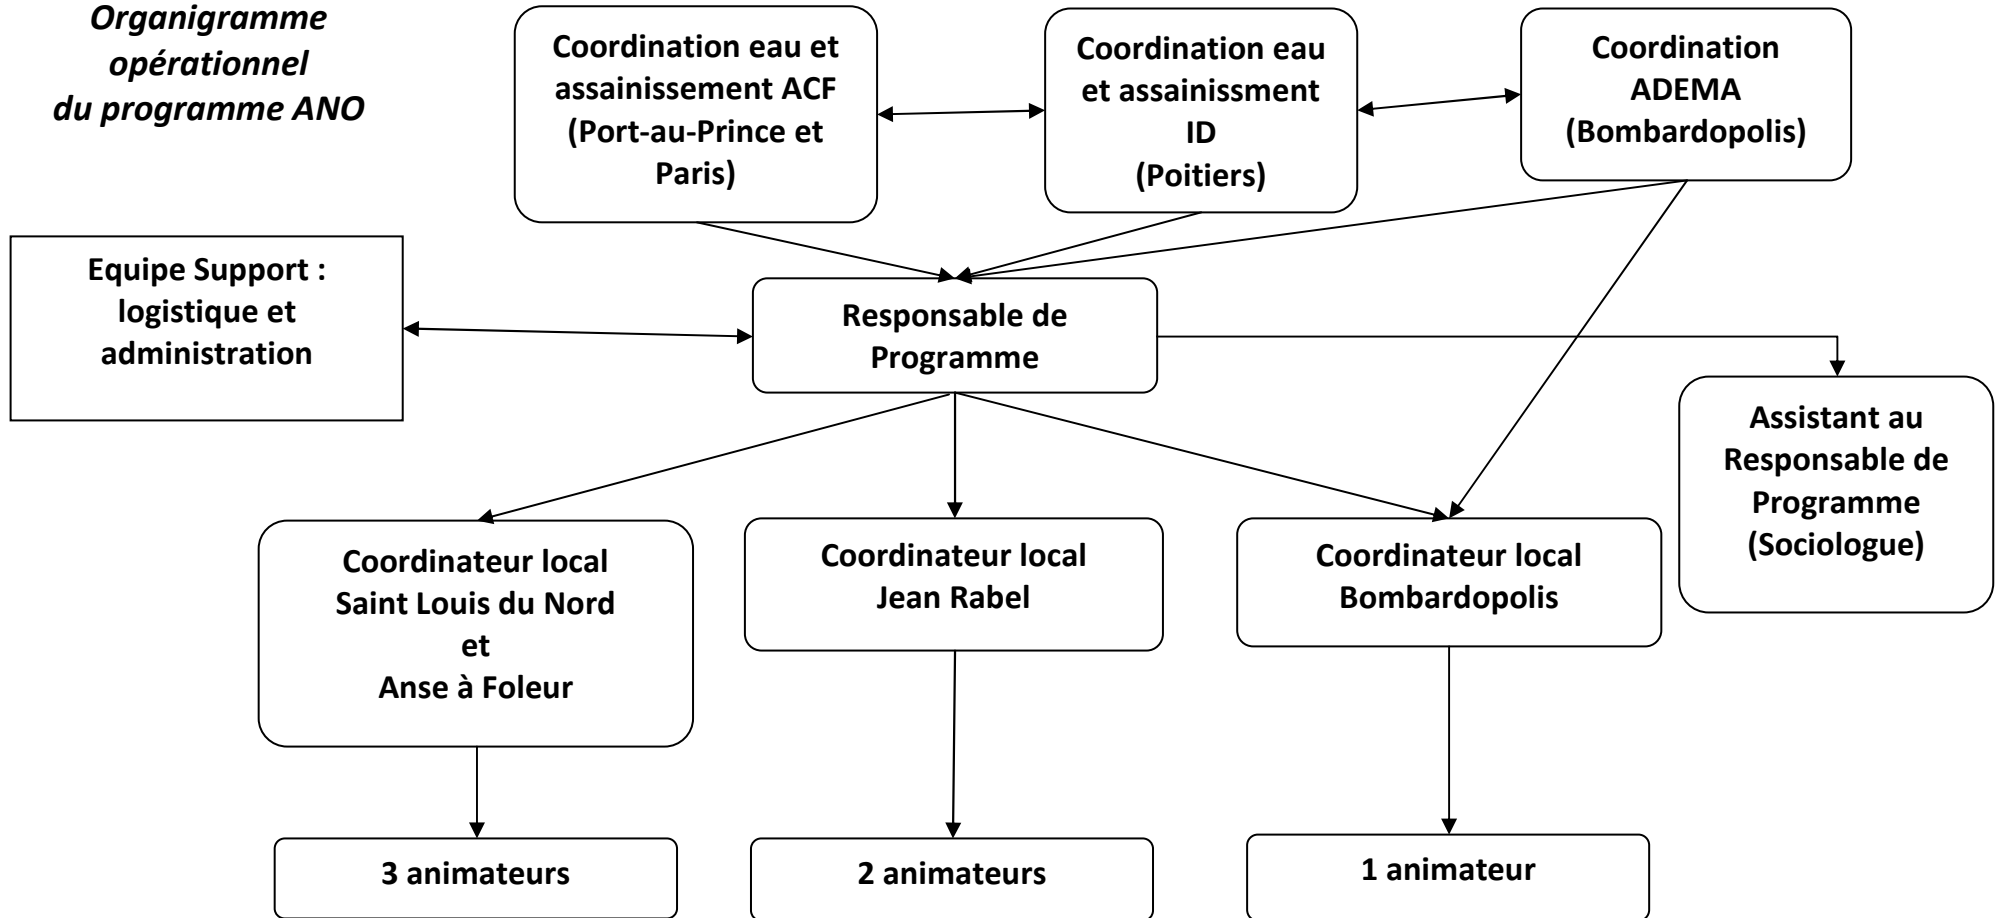

❖ **Principaux résultats attendus et constatés**

	Résultats attendus	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Résultats constatés en fin de projet (selon l'enquête CAP finale et les observations de l'équipe projet)
Résultat 1	Les pratiques liées à l'hygiène sont améliorées	75% des familles de la zone utilisent quotidiennement leur dispositif de lavage et utilisent et entretiennent correctement les latrines construites ou réhabilitées	Près de 100% des familles qui possèdent une latrine terminée l'utilisent. 80% des latrines terminées observés lors de l'enquête CAP sont considérées comme propres. Environ 50% des foyers possèdent un dispositif de lavage des mains, certains ne sont pas utilisés.
		Réduction de 50% de l'occurrence d'eau contaminée dans les récipients de stockage au domicile des bénéficiaires	Les connaissances concernant les dangers d'une eau insalubre et la nécessité de la traiter sont améliorées. Pas de changements de pratiques constatés.
Résultat 2	L'accès aux infrastructures d'hygiène est favorisé	Au sein de chaque zone d'intervention : réduction de moitié des familles n'ayant pas accès à des latrines familiales	Le programme visait une couverture de 70% minimum. Le taux de couverture constaté sur les zones ciblées en décembre 2010 est de l'ordre de 85%.
Résultat 3	Les intervenants du secteur eau et assainissement sont renforcés	50% des CAEPA participent à la mise en place et au financement d'activités assainissement	Les recettes des CAEPA sont actuellement insuffisantes pour participer au financement d'activités d'assainissement en plus de la gestion des réseaux d'Approvisionnement en Eau Potable.

		En fin de projet, ADEMA participe à la mise en œuvre d'un nouveau projet en eau et assainissement	ADEMA et ACF vont mettre en œuvre un projet EAH dans le Bas Nord Ouest à partir d'avril 2011.
Résultat 4	Les aspects techniques et méthodologiques du projet sont capitalisés et diffusés	Un colloque sur l'assainissement exposant en partie les résultats obtenus dans le cadre du projet est organisé à la fin du projet	Un colloque d'échanges d'expériences entre les acteurs de l'assainissement a eu lieu à Port-au-Prince en février 2011. Les résultats et expériences du programme ANO sont capitalisés au sein de fiches diffusées à la DINEPA et aux acteurs de l'assainissement en Haïti.

❖ Données financières

Le coût global du programme ANO s'est élevé à environ 1 200 000 €.

Les bailleurs de fonds suivant ont participé au financement de l'action :

- Ministère français des affaires étrangères et européennes (bailleur principal, financement de 50% du projet)
- UNICEF
- Fond de Solidarité Eau de Grand Lyon - Veolia
- Fondation Lord Michelham
- Grand Poitiers
- Agence de l'Eau Loire Bretagne
- Agence de l'Eau Artois Picardie
- Conseil Régional de Bretagne
- Ville de Quimper
- Solidaire du chocolat
- Système U

❖ Capitalisation du programme

Un des résultats visés par le programme ANO consistait en la capitalisation des stratégies et méthodologies relatives à sa mise en œuvre. Ce travail de capitalisation est destiné aux organisations impliquées dans le projet (ACF, ADEMA et ID), mais également à la Direction de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) ainsi qu'aux acteurs intervenant dans le secteur de l'assainissement en Haïti.

Les informations capitalisées sont diffusées sous forme de fiches développant un aspect technique ou méthodologique du projet :

- Implication des autorités locales,
- Assainissement :
 - Approche participative dans le cadre de la construction des latrines,
 - Techniques de latrines, et ses 3 annexes : Dalle carrée, Dalle ronde bombée et Latrine à fosse étanche,
 - Durabilité des actions de latrinisation,
 - Construction d'un biodigesteur biogaz,
- Hygiène :
 - Méthodologie de sensibilisation à l'hygiène – fiche complétée par les outils de sensibilisation utilisés dans le cadre du projet,
 - Promotion du lavage des mains.

Chaque fiche présente la démarche du programme ANO, en analyse les points forts et points faibles pour en tirer des « leçons à retenir » et des recommandations.

Ce travail de capitalisation est destiné à être largement diffusé, débattu, complété et précisé dans l'objectif d'améliorer la qualité des actions d'assainissement et d'hygiène mises en œuvre pour le développement d'Haïti.
